


AIDE MÉMOIRE – PROCESSUS DE PLANIFICATION DES EXERCICES

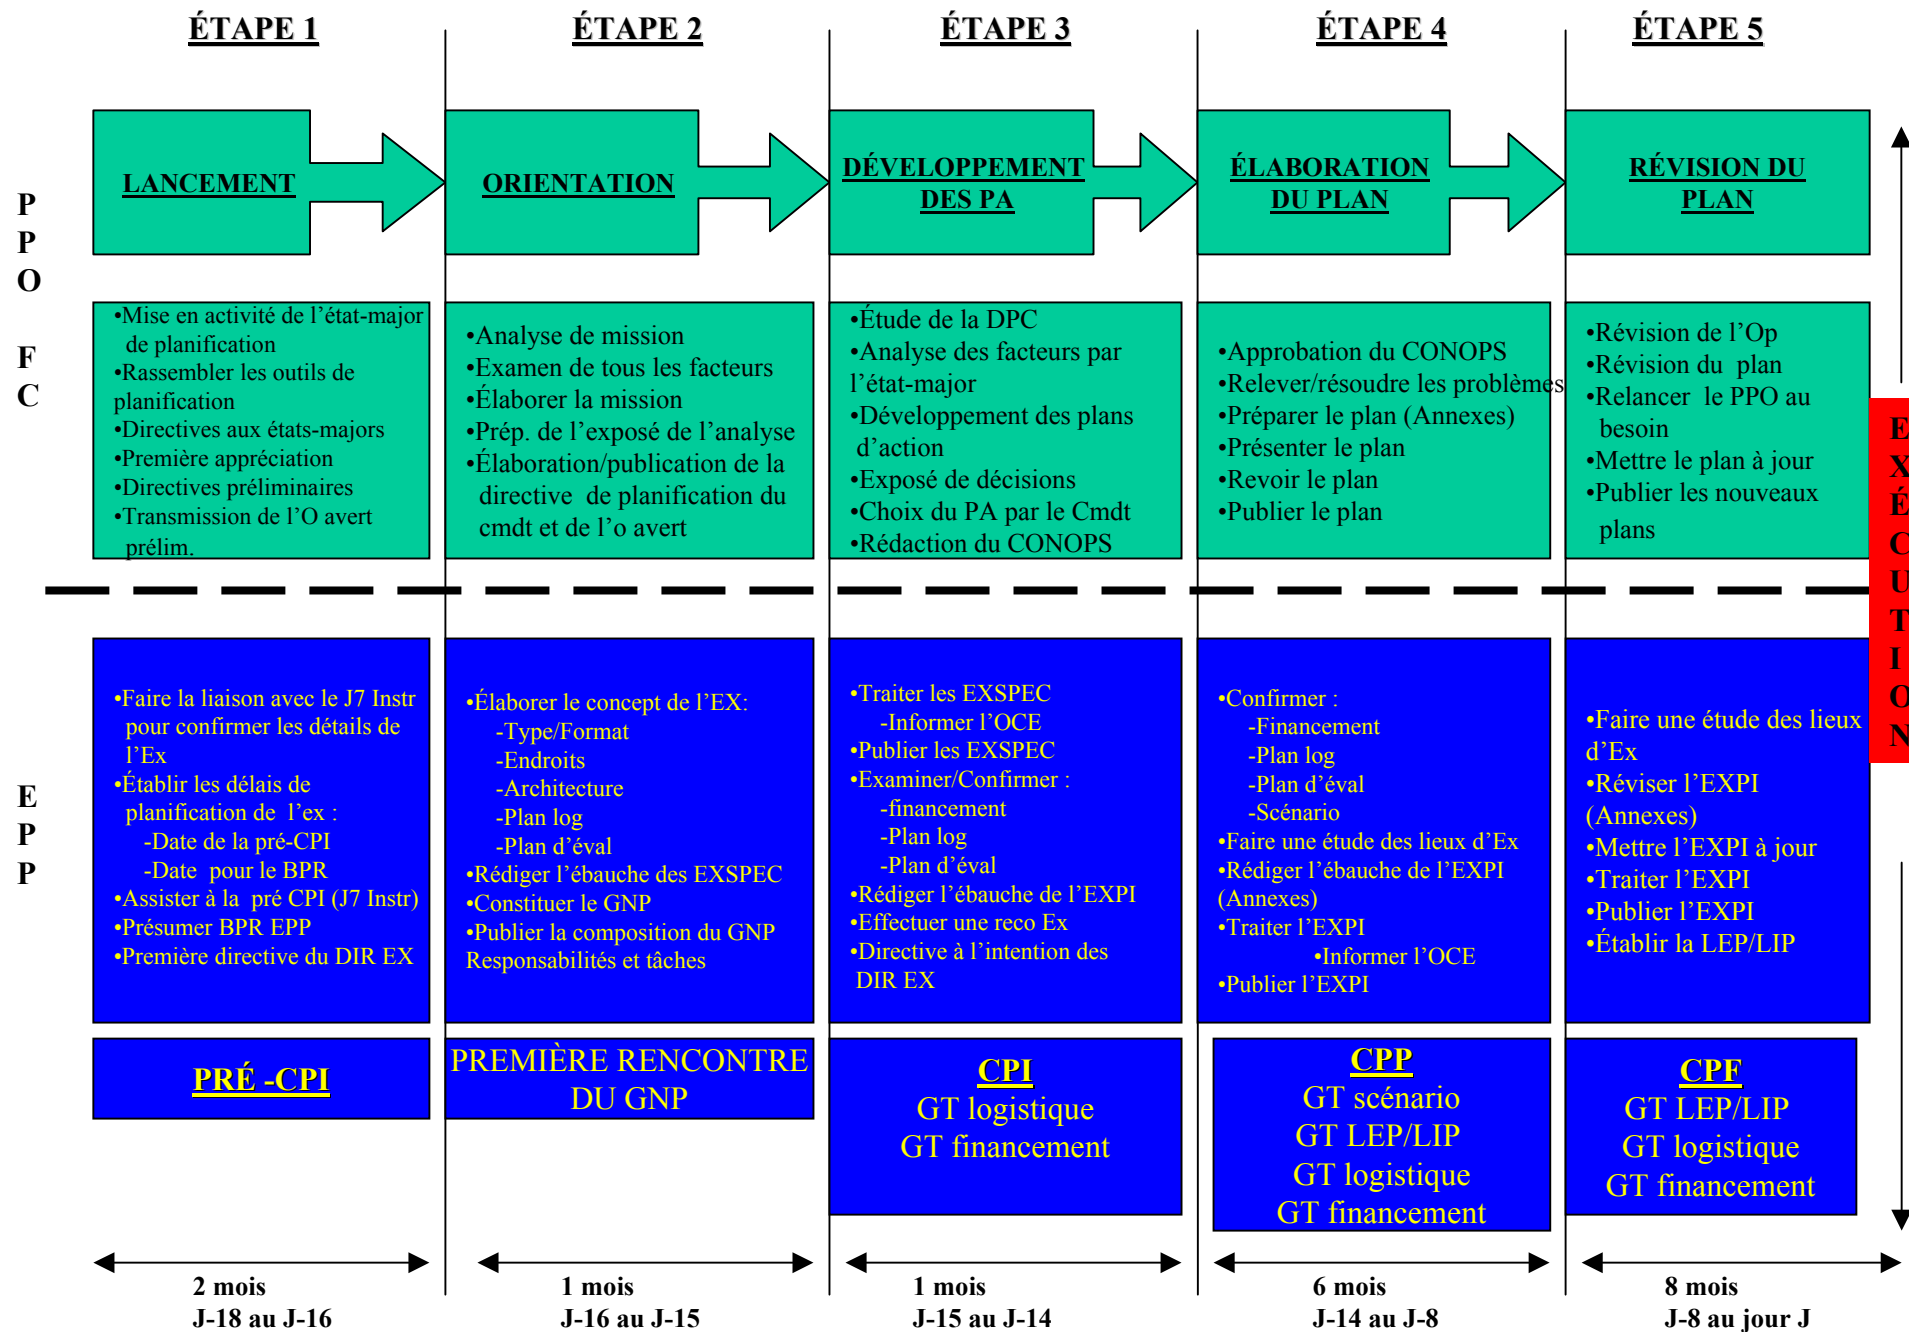

EXÉCUTION

J7 EX – PROCESSUS DE PLANIFICATION DES EXERCICES

ÉTAPE 1 - ENCLENCHEMENT

ÉLÉMENTS CLÉS

- Confirmer les détails du PICS
- Élaborer l'échéancier d'EPP FC
- Pré-CPI
- Le J7 Ex prend la direction de l'EPP
- Première directive du DIR EX

ACTIVITÉS

- Confirmer les détails de la fiche d'ex du PICS :
 - But de l'Ex
 - Relever les OIC
 - Participation
 - Portée/financement
- Établir l'échéance de l'EPP FC
 - Fixer les principaux jalons de planification
 - Relever les principaux besoins et résultats attendus
- Assister à la pré-CPI (J7 Instr dirige)
- Prendre officiellement la direction de l'EPP :
 - À la fin de la pré-CPI
 - Présume que le J7 Instr a confirmé les rens requis sur les fiches de l'Ex
 - À déterminer au cas par cas
 - Avec l'accord du J7 Ex/J7 Instr
- Le DIR EX élabore la Directive de planification initiale
 - Publiée dans l'O avert
 - Dates de planification
 - Participation
 - But/portée
- Mise à jour du site Web J7 Ex

PRODUITS

- Pré-CPI
- Directive de planification initiale à l'intention des DIR EX
 - O avert DIR EX

J7 EX – PROCESSUS DE PLANIFICATION

DES EXERCICES

ÉTAPE 2 - ORIENTATION

ÉLÉMENTS CLÉS

- Constituer le GNP
- Rédiger l'ébauche des EXSPEC

ACTIVITÉS

- Confirmer la composition du GNP.
- Publier les tâches et responsabilités du GNP
- Mettre à jour le site Web J7 Ex
- Le DIR EX fournit des directives au GNP
- Élaborer le plan du concept de l'Ex :
 - But de l'Ex
 - Format et structure de l'Ex
 - Lieu(x) de l'Ex
 - Plan log
 - Plan d'éval
 - Financement
- Rédiger l'ébauche des EXSPEC
 - S'inspirer des fiches de détails sur l'Ex
 - Commentaires du GNP

PRODUITS

- Première réunion du GNP
- Publier les tâches et responsabilités du GNP
- Rédiger l'ébauche des EXSPEC

J7 EX – PROCESSUS DE PLANIFICATION DES EXERCICES

ÉTAPE 3 – DÉVELOPPEMENT DES PLANS D'ACTION

ÉLÉMENTS CLÉS

- Tenir la CPI
- Publier les EXSPEC
- Rédiger l'ébauche de l'EXPI
- Première reco de l'Ex
- Élaboration du plan logistique
- Directives sup du DIR EX

ACTIVITÉS

- Premier exposé à l'OCE
- Tenue de la CPI
 - Avis de convocation à la CPI
 - Confirmation des installations/dispositions pour la CPI
 - Traitement du Compte rendu des décisions de la CPI
- Le personnel affecté à la planification de l'exercice examine et élabore :
 - Le but de l'Ex
 - Le format et la structure de l'Ex
 - Le ou les lieux de l'Ex
 - Le plan log
 - Le plan d'éval
 - Le plan d'EXCON (personnel/Soutien/CIS)
 - Financement
- Traitement des EXSPEC pour signature par l'OCE
 - Doivent être traduites
- Distribuer les EXSPEC
- Mise à jour du site Web du J7 Ex
- Dresser un plan de reco
- Effectuer la première reco d'Ex
 - Composition doit englober le J3, J4 Log/Mouv J6 et repr. du groupe-cible principal de l'instruction
- Dresser un plan log
 - Établir un GT Logistique
- Dresser un plan d'éval
 - Établir un GT Évaluation
- Déterminer le financement de l'Ex
- Rédiger l'ébauche de l'EXPI

PRODUITS

- Tenir la CPI
 - Compte rendu des décisions
- Distribution des EXSPEC
- GT Logistique – Première réunion
- GT Évaluation – Première réunion
- Rédiger l'ébauche des EXPI – pour commentaires

J7 EX – PROCESSUS DE PLANIFICATION DES EXERCICES

ÉTAPE 4 – ÉLABORATION DU PLAN

ÉLÉMENTS CLÉS

- Confirmer le scénario
- Effectuer la reco d'Ex de confirmation
- Rédiger l'ébauche de l'EXPI
- Exposé à l'OCE

ACTIVITÉS

- Développer/confirmer le scénario
 - GT scénario
 - Contexte
 - État initial
- Dresser le plan log
 - GT Log – réunions de suivi
- Dresser le plan d'éval
 - GT éval – réunions de suivi
- Confirmer le financement de l'Ex
 - Attribution de la RSEE
- Traiter l'ébauche d'EXPI
 - Stipuler les dates pour les annexes à l'appui
- Exposé à l'OCE
- Tenir la CPP
 - Avis de convocation à la CPP
 - Détermination finale des installations/dispositions pour la CPP
 - Traitement du compte rendu des décisions de la CPP
 - Confirmation de l'EXPI
 - Distribution de l'EXPI (version 1)
 - Publication des annexes à l'appui au besoin
- Ordre d'assignation des tâches

PRODUITS

- CPP
 - Compte rendu des décisions
- EXPI (version 1)
- Ordre d'assignation des tâches du SCEMD

J7 EX – PROCESSUS DE PLANIFICATION DES EXERCICES

ÉTAPE 5 – RÉVISION DU PLAN

ÉLÉMENTS CLÉS

- Établir la LEP/LIP
 - GT LEP/LIP
- Reco d'ex finale
- Réviser/élaborer/mettre à jour :
 - EXPI
 - Plan logistique
 - EXCON
- Conférence de planification finale
- Publier les annexes EXPI

ACTIVITÉS

- GT LEP/LIP
 - Première réunion
 - Déterminer l'outil LEP/LIP
 - Composition appropriée essentielle
 - Révision LEP/LIP
 - Réunions subséquentes et mise à jour de la base de données
 - Répétition LEP/LIP
- Effectuer la reco d'Ex finale
 - Dresser un plan de reco
 - Mettre la touche finale aux dispositions logistique/EXCON
- Réviser l'EXPI
 - Publier les annexes à l'appui
 - Publier les modifications
- Tenir la CPF (dans le secteur de l'Ex)
 - Avis de convocation pour la CPF
 - Confirmer les installations/dispositions pour la CPF
 - Traiter le compte rendu des décisions de la CPF

PRODUITS

- GT LEP/LIP
- Conférence de planification finale
 - Compte rendu des décisions
- EXPI
 - Modifications
 - Annexes

J7 EX – PROCESSUS DE PLANIFICATION DES EXERCICES

EXÉCUTION

ÉLÉMENTS CLÉS

- Établir l'EXCON
- Répétitions EXCON
- Exposés EXCON :
- Début de l'EX

ACTIVITÉS

- Établir EXCON :
 - Immobilier
 - Organiser EXCON
 - CIS
 - Personnel/Renforts
- Réception:
 - Renfort/Soutien EXCON
 - Groupe-cible de l'instruction
 - OPFOR
- Tenir des répétitions/exposés :
 - Personnel affecté à l'EXCON
 - LEP/LIP
 - OPFOR
 - Groupe-cible de l'instruction
- Début de l'EX
- Programme des visiteurs
- Visites des médias
- Plan d'évaluation
- Compte rendu après action
- Critique à chaud
- Discussion post-exercice
 - Compte rendu postérieur à l'exercice (PXR)

PRODUITS

- Établissement de l'EXCON
- Tenue de l'Ex
- PXR
